

Slutrapport
Projekt DNKS240195/RS220701

Gestaltad livsmiljö

Hanna Smekal 2025-05-27

Innehållsförteckning

Sammanfattning av projektet och dess resultat	1
Bakgrund	1
Mål	2
Effektmål	3
Omfattning	3
Beskrivning av projektets resultat utifrån delmålen	4
Delmål 1: Kartläggning	4
Delmål 2: Kunskapshöjning	5
Delmål 3: Det interna arbetet	6
Delmål 4: Sektorsövergripande nätverk	7
Delmål 5: Det interregionala samarbetet	9
Delmål 6: Förslag på långsiktigt arbetssätt	10
Rekommendationer för det fortsatta arbetet	12
Utifrån nyckelfyndet samt bedömning av måluppfyllelse	12
Utifrån de ansvariga myndigheternas identifiering av den regionala rollen	12

Sammanfattning av projektet och dess resultat

Projektet har syftat till att undersöka vilken roll Region Halland kan ta inom ramen för det av Sveriges riksdag antagna politikområdet Gestaltad livsmiljö. Huvudmålet har varit att utveckla Region Hallands roll som drivande, stödjande och samordnande i frågor kring gestaltad livsmiljö.

Denna slutrapport summerar projektet genom att beskriva dess bakgrund, mål, effektmål och omfattning. Projektets resultat utifrån delmålen och effektmålen beskrivs mer fördjupat inklusive nyckelfynd. Summeringen avslutas med rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Projektets resultat har över lag varit goda. Intresset för Region Hallands satsning på gestaltad livsmiljö har varit stort och rönt uppmärksamhet både i Halland och i övriga Sverige. Region Hallands roll som aktör i frågor rörande gestaltningen av våra livsmiljöer har mottagits positivt, och kunskapen om politikområdet har ökat bland de som kommit i kontakt med projektet.

Då projektledaren påbörjade en ny tjänst på regionkontorets samhällsplaneringsavdelning i oktober 2024, beslutade styrgruppen (Karin Wettermark Jonsson, Mats Bjerde och Erik Hansson) att avsluta projektet något i förtid utan att tillsätta en ny projektledare för den återstående tiden. Styrgruppen ansåg att projektets mål och syfte vid tiden redan var uppnått och att arbetet kunde gå från projekt till ordinarie arbete.

Bakgrund

Sveriges riksdag antog våren 2018 propositionen (Prop. 2017/18:110) för politikområdet Gestaltad livsmiljö, vilken fastslår att: ”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”

Syftet med projektet har varit att undersöka vilken typ av aktör Region Halland kan vara för att närma sig de i propositionen uppsatta målen, det vill säga: vilka typer av ansvar, aktiviteter, samverkansformer och insatser som kan genomföras i enlighet med både den nationella politiken för gestaltad livsmiljö och Region Hallands ramverk. Propositionen anger att ett av de sätt som målet ska nås på är att ”det offentliga agerar förebildligt”.

Nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska uppnås genom att:

- hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden,
- kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
- det offentliga agerar förebildligt,
- estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas,
- miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och
- samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.

Figur 1: Urklipp från propositionen som sammanfattar det från 2018 gällande målet för den svenska arkitektur-, form och designpolitiken (prop. 2017/18:110).

Mål

Huvudmålet med projektet har varit att utveckla region Hallands roll som drivande, stödande och samordnande i frågor kring gestaltad livsmiljö.

Bedömning av måluppfyllelse: Målet är uppnått då en förflyttning skett inom en mängd områden avseende Region Halland som aktör inom politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Förutom huvudmålet har sex delmål formulerats:

1. Kartlägga intressenter, aktörer och pågående processer kopplat till politikområdet i Halland
2. Öka kunskapen kring politikområdet hos intressenter och berörda aktörer i Halland
3. Utveckla det avdelnings- och förvaltningsövergripande samarbetet kring politikområdet på Region Halland
4. Upprätta ett sektorsövergripande nätverk med en digital plattform för kommunala tjänstepersoner som på olika sätt arbetar med gestaltad livsmiljö
5. Utveckla det interregionala samarbetet i frågan
6. Ta fram förslag på ett långsiktigt arbetssätt för att Region Halland ska förbli en relevant aktör som driver utvecklingen av politikområdet framåt även efter projektets avslut.

Effektmål

Att åstadkomma ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer innebär att adressera frågor som klimatförändringar, befolkningsökning, segregation, bostadsbrist, hälsoskillnader och sociala klyftor.

Arbetet inom Region Halland har inte kunnat lösa dessa stora samhällsutmaningar på egen hand, men målet har varit att öka medvetenheten om politikens innehåll och ambitioner, främja strävan mot måluppfyllelse, stärka handlingskraften och bidra med aktiviteter som kan fungera som goda och lärande exempel.

Bedömning av måluppfyllelse: Utifrån projektets begränsade tidsram och delade ansvar för dess stora frågor anses målet vara uppfyllt. Dock är det viktigt att påpeka att strävan efter denna måluppfyllelse fortsätter, inom ramen för arbetet med såväl Regional fysisk plan som Kulturstrategin.

Omfattning

De personella resurserna har bestått av en heltidstjänst under tre år. Flera tjänstepersoner på Region Halland har också deltagit i projektets aktiviteter. Projektets totala budget uppgick till 3,37 miljoner kronor över tre år, varav 1,25 miljoner kronor finansierades av Regional utveckling och resterande från budgeten för Kultur och skola. Budgeten inkluderade finansiering av projektledartjänsten samt cirka 500 000 kronor för genomförande av olika insatser inom projektet.



Foto: *Region Halland*. Åskhults by, en väl bevarad kulturmiljö där viktiga perspektiv kring de miljöer i vilka vi lever våra liv idag synliggörs.

Beskrivning av projektets resultat utifrån delmålen

Delmål 1: Kartläggning

Genomförda aktiviteter

Förutom att skapa en grundförståelse för själva politikområdet handlade den inledande fasen av projektet till stor del om att skapa en förståelse för de kunskapsområden, sektorer och aktörer som ingår i politikområdet. Både i Halland och nationellt. De huvudsakliga sektorerna som är involverade i gestaltningen av vår livsmiljö inkluderar samhällsplanering, arkitektur, offentlig konst, kulturmiljö och design. En översiktlig aktörskarta togs fram, och för att komma vidare till mer konkret genomförande påbörjades dialoger med de identifierade parterna.


Nyckelfynd kring arbetet med kartläggning

- Områdets bredd och den stora mängden aktörer gjorde området svårt att kartlägga till fullo, och visade också på ökat behov av dialog snarare än en omfattande kartläggning.
- Kartan över aktörer har fortsatt att utvecklas och har fyllts på över tid.
- Projektledaren gjorde ställningstagandet att det var viktigare att starta upp samverkan med de offentliga aktörerna i Sverige och Halland, än att etablera kontakt med alla aktörer som över huvud taget har påverkan på den byggda miljön i Halland. Dock har dörren hela tiden varit öppen för samtliga aktörer som velat träffas och samtala om gestaltad livsmiljö.

Bedömning av måluppfyllelse

Delmålet anses uppnått eftersom projektet har skapat en tillräckligt tydlig bild av relevanta aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå för att kunna driva utvecklingen med politikområdet framåt.

Ett fortsatt arbete efter projektet skulle kunna vara att hitta sätt att komma i dialog med fler parter, såsom civilsamhället och näringslivet.

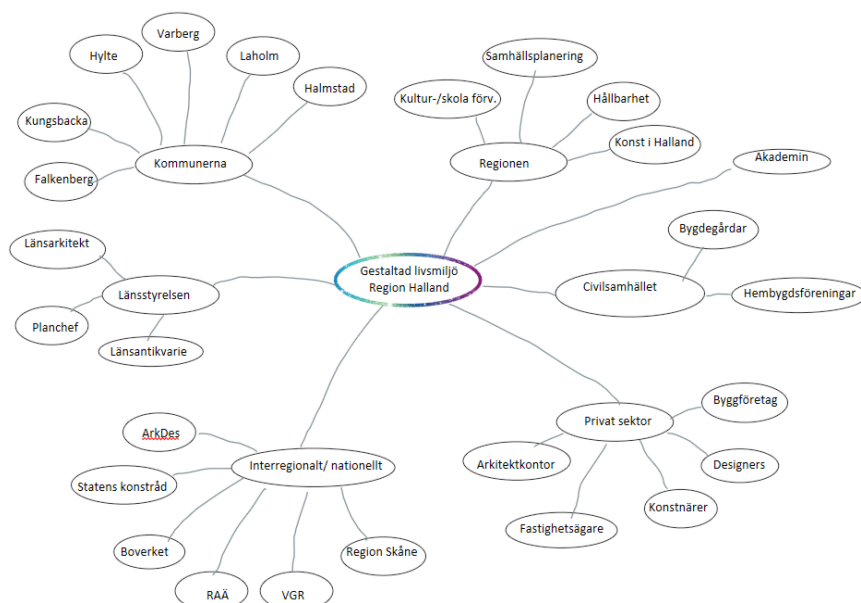

Figur 2:
Ögonblicksbild från
projektledarens
mind map över
aktörer. Daterad
13 mars 202

Delmål 2: Kunskapshöjning

Genomförda aktiviteter

Ett presentationsmaterial har tagits fram som på en grundlig nivå förklarar innehållet i politikområdet samt ger exempel på genomförda projekt som verkar inom politikområdets utpekade mål. Projektledaren har presenterat materialet och hållit kortare dialoger i samband med presentationerna. Utbildningen har varierat i längd från 15 till 90 minuter beroende på tillgänglig tid och har justerats inför varje tillfälle beroende på forum och målgrupp. Totalt har cirka 200 personer tagit del av utbildningsinsatsen, inklusive både regionala politiker och tjänstepersoner inom både region och kommun.

Sedan sommaren 2024 finns även en utbildning framtagen av de fyra ansvariga myndigheterna, som hålls med hjälp av ett bildspel och talmanus under ungefär en halvdag. Denna utbildning har projektledaren erbjudit att hålla i de organisationer som det uppstartade nätverkets medlemmar arbetar inom (se delmål 4), men ingen har hittills tackat ja till erbjudandet.

Övriga aktiviteter kopplat till kunskapshöjning har varit att projektledaren samlat på sig kunskaper om politikområdet genom att läsa olika texter, samtala med en bredd av aktörer, delta i konferenser och webinarier. Den förvärvade kunskapen har kunnat förmedlas i möten med de som på olika sätt varit involverade i projektet.

Nyckelfynd kring arbetet med kunskapshöjning

- Många har väntat länge på att myndigheternas utbildning skulle bli färdig.
- Det har funnits stort intresse för den mer flexibla utbildningen som projektledaren har erbjudit, särskilt på grund av dess kortare tid och möjlighet att nå fler.
- Ingen av de erbjudna utbildningarna har nått några kommunpolitiker. Kanske har det att göra med att de inte fått någon direkt inbjudan från Regionen, då erbjudandet har gått via de kommunala tjänstepersoner som är med i nätverket.
- Utbildningen har fått särskilt stor spridning bland tjänstepersoner och politiker inom Region Halland.

Bedömning av måluppfyllelse

Delmålet anses uppnått eftersom flera insatser har gjorts för att höja kunskapen om politikområdet.

Kunskapshöjning är inte en engångsinsats utan behöver i en eller annan form fortgå även efter projektets avslut.

Delmål 3: Det interna arbetet

Genomförda aktiviteter

Ett kollegialt utbyte har skett genom att dela kunskap och ha möten med kollegor vars uppdrag ligger nära eller inom politikområdets ämnen, såsom kulturella och kreativa branscher (KKB), kulturarvsutveckling och offentlig konst.

Förutom de avdelningar inom Region Halland som varit direkt involverade i projektet har träffar hållits även med representanter för Hälso- och sjukvården samt Fastighetsavdelningen.

Dessutom har politikområdets perspektiv integrerats i pågående projekt och processer, såsom den nya Kulturstrategin och Kulturplanen, samt arbetet med den regionala fysiska planen.

Nyckelfynd kring det interna arbetet

- Det är önskvärt att fortsätta det goda samarbete som uppstått hittills och även bredda det inom organisationen.
- Regionen behöver hantera sin specifika organisation där rollerna som aktör inom det regionala utvecklingsuppdraget, inom kultur, som kollektivtrafikmyndighet och som aktör för vård och hälsa är de som närmast kopplar till politikområdet. Dessa uppdrag skiljer sig sinsemellan men det finns en stor potential i att samlas kring de miljöer och rum som regionen har en direkt påverkan på.
- Det faktum att projekttiden sammanföll med framtagandet av regional fysisk plan innebar att samhällsplaneringsavdelningen och Kultur och skola tog parallella steg i att få ett större mandat samt bli en tydligare aktör i frågor som rör utformning och fysisk gestaltning. Detta var en framgångsfaktor för att få projektet att landa in såväl internt som externt.
- Våren 2024, alltså ett drygt år in i projektet så rekryterades en strateg till samhällsplaneringsavdelningen med erfarenhet av att arbeta med gestaltad livsmiljö i en regional kontext. Detta gav projektledaren på Kultur och skola en tydligare koppling och ingång till samhällsplaneringsavdelningen.

Bedömning av måluppfyllelse


Målet anses uppfyllt eftersom en hel del aktiviteter genomförts under projekttiden som medverkat till att etablera fler kontaktytor mellan avdelningar och förvaltningar angående gestaltad livsmiljö. Inte minst de mellan Regional samhällsplanering och Kultur och skola.

Det finns många möjligheter med att fortsätta bredda, stärka och utveckla samarbetsytorna internt på Region Halland även efter projektets slut.

Delmål 4: Sektorsövergripande nätverk

Genomförda aktiviteter

Denna del av projektet har varit den mest omfattande och även den som rönt mest uppmärksamhet. Under hösten 2023 startade Region Halland ett nätverk för tjänstepersoner som behandlar frågor inom politikområdet. Ungefär 40 personer, med deltagare från samtliga halländska kommuner samt några regionala aktörer är med. Nätverket har utökats med ungefär 10 personer sedan starten.

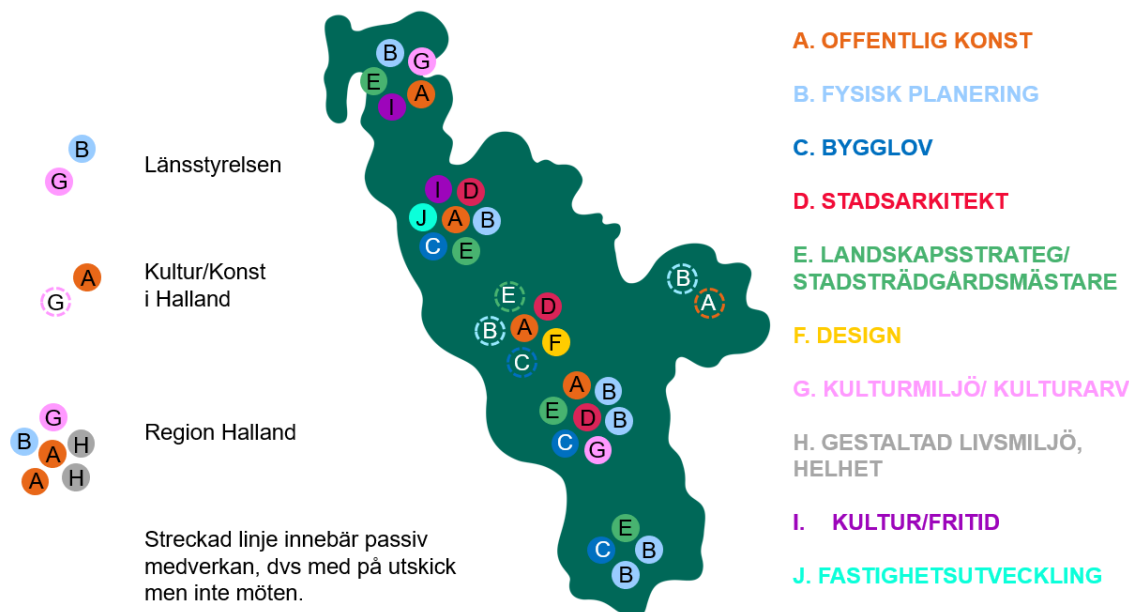

Figur 3: En bild över nätverkets representanter och deras respektive roller såsom det ser ut våren 2025. Nätverkets representanter har ändrats något över tid på grund av omsättning av tjänster. Tendensen är att fler tillkommit.

Uppstarten bestod under våren 2023 av en initial kontakt med tjänstepersoner som sedan tidigare var kända för projektledaren, samt kunde antas ha ett intresse för frågan. Framför allt skedde dessa avstämningar via digitala möten. Vid varje möte ställdes frågan om personer kände till politikområdet sedan innan, ifall denne var intresserad av att delta i ett nätverk samt ifall det fanns fler personer som projektledaren borde kontakta för ytterligare samtal. Mottagandet var mycket gott och regionens initiativ upplevdes som mycket efterlängtad.

Under hösten 2023 hölls digitala möten med nätverkets medlemmar med gott om tid för gemensamma reflektioner och utbyte av erfarenheter inom ramen för politikområdet. Detta gav grund för en GAP-analys som nätverket tog fram gemensamt. Året avslutades med en kommunturné där projektledaren besökte nätverkets representanter. Detta upplevdes också positivt då det många gånger var första gången nätverkets representanter samlades i just den konstellationen i den egna kommunen. Att träffarna var fysiska innebar ett bättre samtal i grupperna än vad som ofta blir digitalt. Detta inspirerade till ett segment som genomförts under 2024 som kallas "Allt ljus på..." då projektledaren än en gång träffat fem av sex

kommuners nätverksrepresentanter och genomfört en intervju kring hur gestaltad livsmiljö genomförs i respektive kommun. Samma frågor har ställts till alla grupper och resultatet har löpande i takt med att intervjuerna genomförts, skickats ut till samtliga i nätverket. Detta har gett en bra jämförelse över vad som skiljer sig åt men också vad som är likt i arbetet med gestaltad livsmiljö i de halländska kommunerna.

Under 2024 har projektledaren också skickat ut nyhetsbrev med aktuell information, tips och inspiration kring sådant som rör politikområdet. Detta har varit en viktig del av att förmedla sådant som kommer till projektledarens kännedom, inte minst via det nationella nätverket (se punkt 5).

Under våren 2024 hölls två digitala träffar som även innehöll föreläsningar, för gemensam kunskapshöjning och reflektion. Dessutom anordnade Region Halland en studieresa till Borås. Nätverket fick träffa representanter från Borås kommun samt kommunalförbundet Boråsregionen. Inte minst upplevdes möjligheten till informella samtal mellan nätverkets medlemmar som väldigt positivt.

Nyckelfynd kring arbetet med sektorsövergripande nätverk

- Den här delen har varit uppskattad av medverkande tjänstepersoner och får därmed anses framgångsrik. Den har fyllt ett tomrum och skapat ett nytt forum för gemensam reflektion och samverkan inom ett område som många har ett behov av att få byta erfarenheter inom.
- Det är dock en utmaning att nå längre än till samtal. Faktisk samhandling är mer utmanande att uppnå. Det kräver att mycket ska klaffa i förhållande till det arbete som parallellt är i gång i de olika kommunerna. Men här finns potential och frågan bör hanteras vidare.
- Det är svårt att nå fram till länets allra minsta kommun där resurserna är knappa.
- Det är en utmaning att samsas kring politikområdets bredd, med det är samtidigt dess styrka. Genom nätverket har kollegor kunnat träffas i ett helt nytt sammanhang och regionens roll som facilitator i detta har varit mycket uppskattad. I den rollen ingår att jämka utrymme och perspektiv för de olika sektorerna som ingår i nätverket. Det är särskilt känsligt eftersom just gestaltningsfrågorna ofta trängs undan i de vanliga samhällsbyggnadsprocesserna. Här har projektledaren behövt aktivt arbeta för att skapa en stämning av gemenskap i stället för konkurrens.

Bedömning av måluppfyllelse

Delmålet har uppfyllts då ett nätverk med framgång är uppstartat. Det samarbete, de relationer och det förtroende som arbetats upp mellan Regionen och kommunerna gör att det är viktigt att fortsätta med nätverket även efter projektets slut.

Delmål 5: Det interregionala samarbetet

Genomförda aktiviteter

En annan viktig del av projektet har varit att vara en del av den nationella strukturen som byggts upp för politikområdets framdrift. De fyra ansvariga myndigheterna (Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och Statens centrum för arkitektur och design: ArkDes) har olika ansvarsområden som kopplat an till detta projekt på olika sätt. Kanske tydligast har varit det nod-nätverk som ArkDes sammankallar till, där representanter från samtliga regioner träffar ansvariga i de fyra myndigheterna ungefär 6 gånger per år. Under projektets gång har Region Halland kunnat vara en aktiv part i nätverket som under den här tiden blivit en alltmer etablerad resurs i arbetet med gestaltad livsmiljö i Sverige. Dessa återkommande träffar har inneburit att goda kontakter mellan såväl regioner som mellan region och myndigheter knutits.

Dessutom har Region Halland varit en del av något mer avgränsade utbyten, med Västra Götalandsregionen, Region Skåne samt Region Kronoberg, i form av både fysiska och digitala träffar. Kontakt med Region Norrbotten som haft ett liknande projekt som det halländska har även etablerats. Region Halland har även haft ett mindre arbete tillsammans med representanter från Boverket i samband med att tre av de sex halländska kommunerna skrivit styrdokument för arkitektur samtidigt.

Projektledaren har även varit med på ett EU-utbyte samt övriga aktiviteter kopplade till den europeiska nivån och EU-kommissionens initiativ kallat New European Bauhaus som i mångt och mycket motsvarar den svenska politiken för gestaltad livsmiljö.

Nyckelfynd kring det interregionala samarbetet

- Det är av stort värde att ta del av det nationella nätverket och en bra plattform för Region Halland att visa upp det arbete som bedrivs i Halland.
- Politikområdet befinner sig inte i ett stillestånd och i takt med att saker förändras är det än viktigare att ta del av andras kunskaper och erfarenheter, inte minst i kopplingen till arbetet på EU-nivå.
- Denna delaktivitet har potential att generera idéer och samarbeten som kan innebära att projekt genomförs och investeringsmedel knyts till Halland.
- Detta har varit en viktig arena för att generera uppmärksamhet kring den satsning Region Halland har gjort genom det här projektet.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet har uppfyllts eftersom samarbetet mellan Region Halland och övriga regioner utvecklats under projektiden. För det kommande arbetet blir det viktigt att fortsätta sätta Halland på den nationella kartan vad gäller en god gestaltning av de halländska livsmiljöerna.

Delmål 6: Förslag på långsiktigt arbetssätt

Genomförda aktiviteter

Under projektets gång uppkom olika tankar och idéer kring på vilket sätt frågorna som hanterar gestaltad livsmiljö skulle kunna finnas kvar inom regionen även efter projektets slut, inte minst i de återkommande styrgruppsmöten som hållits, där detta varit en återkommande punkt.

Bedömning av måluppfyllelse

Eftersom detta var tänkt att hanteras i en slutrapport som var tänkt till våren 2026 så finns inget framtaget material eller systematiskt arbetssätt kring denna uppgift. Dock har frågan delvis besvarat sig själv då projektledaren i oktober påbörjade en tillsvidaretjänst och därmed, ihop med nya arbetsuppgifter, kan bära med sig arbetet, aktiviteterna och erfarenheterna från projekt Gestaltad livsmiljö.

De tankar och idéer som uppkommit under arbetets gång finns sammanfattade under rubriken *Rekommendationer för det fortsatta arbetet* nedan.

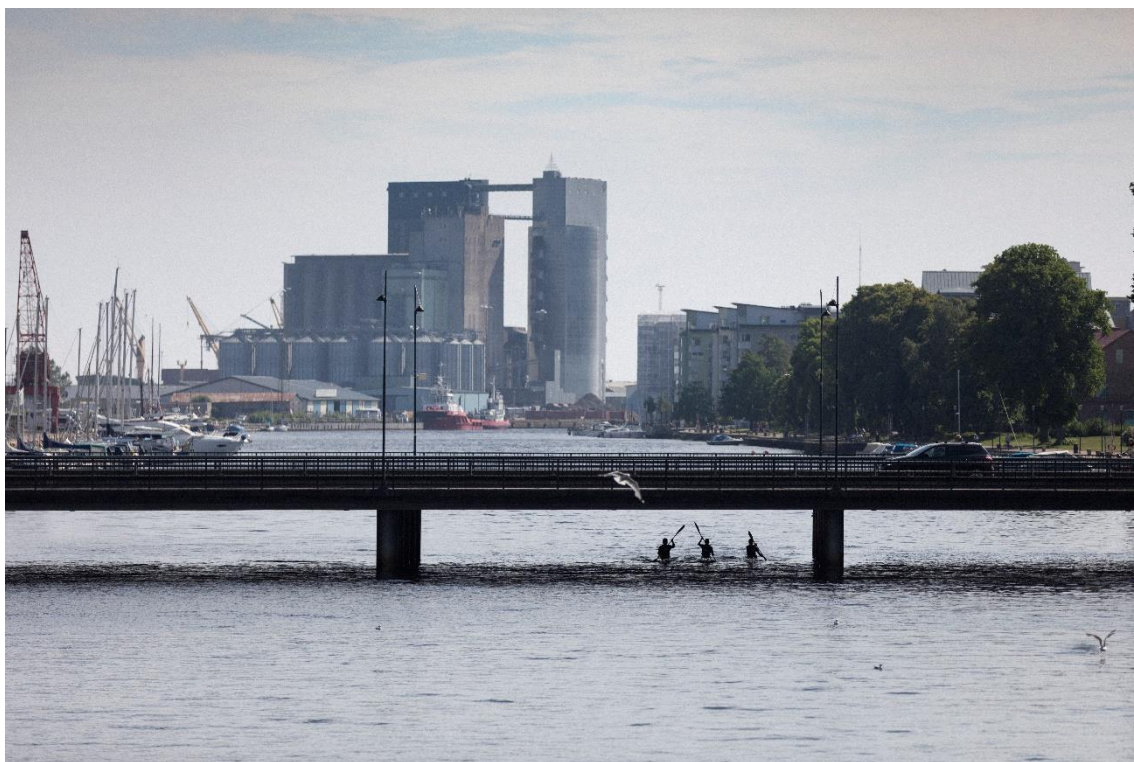


Foto: *Region Halland*. Bro över Nissan. De livsmiljöer vi lever i formas till stor del av oss människor, och vi påverkas av de miljöer vi lever i.

Sammanfattning av samtliga nyckelfynd

Utmaningar och anpassningar

- Svårt att göra en komplett kartläggning på grund av det breda området och den stora mängden aktörer.
- Svårighet att nå fram till länets allra minsta kommun där resurserna är knappa.
- Svårt att jobba med påverkan i flera led – en sak att få medlemmar i nätverket att delta i aktiviteter, svårare att få dem att få med andra.

Strategiska insikter

- Projektledaren prioriterade samverkan med offentliga aktörer i Sverige och Halland över att etablera kontakt med samtliga aktörer som har med politikområdet att göra.
- Regionens förhållningssätt till gestaltad livsmiljö varierar med de olika uppdrag som regionen har, däribland regional utveckling, hälso- och sjukvård, kulturunderstöd och kollektivtrafik m.fl.
- Kombinationen av få och relativt jämnstora kommuner med mestadels god tillväxt ger Halland goda förutsättningar för samarbete.
- Arbetet med politikområdet förändras kontinuerligt och det är viktigt att ta del av andras kunskaper och erfarenheter.

Lärdomar

- Den flexibla utbildningen som projektledaren tagit fram har varit populär och nått många tjänstepersoner och politiker inom Region Halland.
- Rekrytering av ytterligare tjänsteperson med erfarenhet av arbete med gestaltad livsmiljö på regional nivå har varit en framgångsfaktor.
- Projektet har skapat ett nytt forum för gemensam reflektion och samverkan inom ett område med stort behov av erfarenhetsutbyte.
- Tre år är en lång tid för ett projekt, vilket kräver uthållighet och kontinuerligt engagemang, samtidigt som det inte är så lång tid till att skapa grunden för nya typer av samarbeten och projekt som bygger på de långsiktiga målsättningarna med politikområdet gestaltad livsmiljö.

Rekommendationer för det fortsatta arbetet

Utifrån nyckelfynden samt bedömning av måluppfyllelse

- Fortsätta och bredda det goda samarbetet inom organisationen. Fortsätt synliggöra möjligheten att samlas kring de miljöer och rum som regionen har direkt påverkan på. För att kunna bedriva det fortsatta arbetet bör även ett internt nätverk för gestaltad livsmiljö upprättas inom Region Halland.
- Ta vara på det upparbetade förtroende som Region Halland har i nätverket för kommunala tjänstepersoner. Arbeta aktivt för att förvalta en stämning av gemenskap. Tillvarata potentialen i detta nätverk som grund för samverkan kring konkreta projekt.
- Undersök möjligheten att även utveckla samarbeten med civilsamhälle och näringsliv.
- Utnyttja den nationella nätverksplattformen för att visa upp Region Hallands arbete och generera idéer och samarbeten.
- Ta vara på regionens potential i dess olika uppdrag för att verka faciliterande och stärka andra aktörer i arbetet med att utveckla gestaltad livsmiljö.
- En översyn bör göras över eventuella tillskott av medel för att kunna genomföra föreslagna åtgärder.

Utifrån de ansvariga myndigheternas identifiering av den regionala rollen

De för politikområdet ansvariga myndigheterna (Riksantikvarieämbetet, Boverket, Statens konstråd och ArkDes) har som beskrivits ovan tagit fram en utbildning om gestaltad livsmiljö. I den visas en bild över regionens roll som aktör inom politikområdet. (Fig. 3) Följande rekommendationer har tagits fram baserat på informationen i figuren.

Regionen formar livsmiljöer <u>direkt</u> bland annat genom sitt offentliga uppdrag att...	Regionen formar livsmiljöer <u>indirekt</u> bland annat genom att...
<ul style="list-style-type: none">• Bygga vårdmiljöer (byggherre).• Ansvara för infrastruktur- och kollektivtrafiksatsningar.• Ansvara för regional utveckling för det allmänna.• Stärka platsutveckling, identitet och kulturarv i regionen.• M.m.	<ul style="list-style-type: none">• Ta fram vägledningar och regionala strategier (ex. RUS).• Bedriva regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen (ex. regionplan).• Utöva kunskapsspridning.• Finansiera projekt.• M.m.

Figur 4: En bild från de fyra ansvariga myndigheternas utbildning om gestaltad livsmiljö där regionens roll inom politikområdet illustreras.

Bygga, förvalta och utveckla hälso- och sjukvårdsmiljöer

- Anordna workshops och utbildningar om hur gestaltad livsmiljö kan förbättra hälso- och sjukvårdsmiljöer.
- Genomföra pilotprojekt för att implementera principer för gestaltad livsmiljö i nya eller befintliga vårdinrättningar.

Kommande investeringar i byggandet av vårdmiljöer i Halland är ett utmärkt tillfälle att arbeta med båda ovanstående punkter.

Ansvara för infrastruktur- och kollektivtrafiksatsningar

- Säkerställa att principer för gestaltad livsmiljö integreras i planering och genomförande av infrastruktur- och kollektivtrafikprojekt.

Ansvara för regional utveckling för det allmänna

- Ge stöd och finansiering till lokala initiativ som syftar till att förbättra den gestaltade livsmiljön. Lyfta lokala initiativ som föregångare på interregional och nationell nivå.
- Anordna offentliga samråd för att involvera medborgare i utvecklingen av regionala projekt.

Stärka platsutveckling, identitet och kulturarv i regionen

- Initiera projekt som bevarar och lyfter fram regionens kulturarv och identitet.
- Utveckla arbetet med platsutveckling. Det kan bli ett viktigt verktyg för att stärka lokala identiteter och skapa attraktiva miljöer. Det kan även visa på möjligheterna som involvering av kompetens inom gestaltad livsmiljö bidrar till.

Ta fram vägledningar och regionala strategier

- Skapa vägledningar och best practices för hur principer för gestaltad livsmiljö kan implementeras i olika projekt.
- Utarbeta strategiska planer för långsiktig utveckling av gestaltad livsmiljö i regionen. Arbeta brett tillsammans för att säkerställa att gestaltad livsmiljö integreras i regionala och kommunala beslut.

Bedriva regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen

- Säkerställa att principer för gestaltad livsmiljö integreras i den regionala fysiska planeringen.
- Anordna workshops och utbildningar om hur gestaltad livsmiljö kan integreras i den regionala planeringen och vilka förtjänster det kan ge.
- Arbeta tillsammans med kommuner och relevanta myndigheter för att implementera plan- och bygglagen med fokus på gestaltad livsmiljö.

- Utveckla verktyg och metoder för att underlätta integreringen av gestaltad livsmiljö i planeringsprocesser.

Utöva kunskapsspridning

- Fortsätta erbjuda utbildningar och workshops för att sprida kunskap om gestaltad livsmiljö.
- Utveckla och underhålla digitala plattformar för att dela information, nyheter och best practices inom politikområdet.
- Publicera rapporter och artiklar som dokumenterar framsteg och lärdomar om gestaltad livsmiljö i Halland.

Finansiera projekt

- Aktivt söka finansiering från nationella och europeiska fonder för att stödja projekt inom gestaltad livsmiljö.
- Erbjuder ekonomiskt stöd till lokala initiativ och projekt som främjar gestaltad livsmiljö.
- Etablera partnerskap med privata och offentliga aktörer för att finansiera och genomföra projekt.

Hanna Smekal
hanna.smekal@regionhalland.se
DNKS240195 / RS220701

Region Halland
Box 517, 301 80 Halmstad
regionen@regionhalland.se
regionhalland.se
